

EAP e Cronograma - Módulo Funcionários HEICOMP 2025

Estrutura Analítica do Projeto (EAP) + Histórias do Usuário

Grupo: Fernanda, Lucas, Julia, Sara, Fábio e Fagner

INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

- **Duração Total:** 11 semanas (72 dias úteis)
- **Data Início:** 17/09/2025 (Quarta-feira)
- **Data Fim:** 27/11/2025 (Quinta-feira)
- **Equipe:** 6 membros (grupo otimizado)
- **Módulo:** Dashboard Funcionários, Estagiários e PCD
- **Estratégia:** Início com Prototipagem Navegável (Design-First)

1. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

1.0 PROJETO MÓDULO FUNCIONÁRIOS (ABORDAGEM DESIGN-FIRST)

- **1.1 PROTOTIPAGEM E DESIGN** (Semana 1-2) - **PRIORIDADE**
- **1.2 ANÁLISE E PLANEJAMENTO** (Semana 1-2) - **PARALELO**
- **1.3 DESENVOLVIMENTO BACKEND** (Semana 3-6)
- **1.4 DESENVOLVIMENTO FRONTEND** (Semana 3-7)
- **1.5 INTEGRAÇÃO E TESTES** (Semana 8-9)
- **1.6 IMPLANTAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO** (Semana 10-11)

2. HISTÓRIAS DO USUÁRIO POR EPIC

EPIC 1: Gestão de KPIs de Funcionários

♦ História 1.1: Visualizar Funcionários Ativos

Como gestor de RH

Eu quero visualizar o número de funcionários ativos por campus

Para que eu possa monitorar o quadro atual da instituição

Critérios de Aceite:

-  Mostrar total de funcionários ativos em card destacado
-  Filtrar por setor e período
-  Atualizar dados automaticamente a cada 15 minutos
-  Responsivo para mobile ($\leq 414\text{px}$)

♦ História 1.2: Monitorar Funcionários em Licença

Como coordenador administrativo

Eu quero ver quantos funcionários estão em licença e por qual motivo

Para que eu possa planejar redistribuição de tarefas

Critérios de Aceite:

-  Exibir total de licenças ativas
-  Breakdown por tipo de licença (médica, maternidade, etc.)
-  Alerta quando >10% do quadro estiver em licença
-  Duração média das licenças

♦ **História 1.3: Acompanhar Estagiários**

Como supervisor de estágio

Eu quero visualizar quantos estagiários temos ativos

Para que eu possa controlar vagas e renovações

Critérios de Aceite:

-  Total de estagiários ativos
-  Estagiários próximos ao fim do contrato (alerta 30 dias)
-  Distribuição por setor/curso
-  Taxa de efetivação

♦ **História 1.4: Monitorar Inclusão PCD**

Como gestor de compliance

Eu quero acompanhar o percentual de PCD no quadro

Para que eu possa garantir cumprimento da lei de cotas

Critérios de Aceite:

-  Percentual atual de PCD
-  Alerta se abaixo de 2% (lei de cotas)
-  Breakdown por tipo de deficiência
-  Comparativo com meta legal (2-5%)

EPIC 2: Dashboards e Relatórios

♦ História 2.1: Dashboard Mobile-First

Como usuário móvel

Eu quero acessar os KPIs pelo meu smartphone

Para que eu possa consultar dados em qualquer lugar

Critérios de Aceite:

-  Interface otimizada para $\leq 414\text{px}$
-  Cards touch-friendly (mín. $44 \times 44\text{px}$)
-  Navegação por polegar (bottom-nav)
-  Carregamento $\leq 4\text{s}$ em 3G

História 2.2: Filtros Dinâmicos

Como coordenador

Eu quero filtrar dados por campus e período

Para que eu possa focar na minha área de responsabilidade

Critérios de Aceite:

-  Seletor de período (mês/semestre/ano)
-  Persistir filtros na sessão
-  Botão "Limpar filtros"

◆ História 2.3: Exportar Relatórios

Como analista

Eu quero exportar os dados em CSV

Para que eu possa fazer análises complementares

Critérios de Aceite:

-  Botão de exportação visível
-  CSV com dados filtrados
-  Nome do arquivo com timestamp
-  Funcionar offline (dados em cache)

EPIC 3: Sistema de Alertas

♦ História 3.1: Alertas Visuais

Como gestor

Eu quero receber alertas visuais sobre indicadores críticos

Para que eu possa tomar ações corretivas rapidamente

Critérios de Aceite:

-  Código de cores (verde/amarelo/vermelho)
-  Lista de alertas consolidada
-  Explicação clara do problema



Cronograma Por Semanas - HEICOMP 2025

Dashboard de Funcionários - 17/09/2025 a 27/11/2025

Equipe: 6 pessoas | Estratégia: Design-First



SEMANA 1-2: CRIAR PROTÓTIPO (17/Set - 30/Set)



Estudar usuários e criar personas

Definir quem são os gestores que vão usar o app

2 dias

UX Lead



Desenhar telas no papel (Wireframes)

5 telas principais: Login, Dashboard, Detalhes, Filtros

3 dias

UX Designer



Criar Design System

Definir cores, fontes e componentes visuais

2 dias

UI Designer



Protótipo clicável no Figma

Versão navegável para testar com usuários

4 dias

UX/UI Team



Testes com usuários reais

5 gestores testando o protótipo

2 dias

UX Researcher



Melhorar protótipo

Ajustar baseado no feedback dos usuários

2 dias

UX/UI Team



MARCO 1 (01/Out): Protótipo Aprovado e Testado

⚙️ SEMANA 3-6: PROGRAMAR SISTEMA (01/Out - 25/Out)



Configurar FastAPI

Preparar estrutura base do sistema

2 dias

Dev Backend 1



Conectar banco MySQL

Ligação com dados dos funcionários

2 dias

Dev Backend 1



Criar modelos de dados

Estruturas para funcionários, licenças, etc.

3 dias

Dev Backend 1



Relatório: Funcionários Ativos

Quantos funcionários estão trabalhando

3 dias

Dev Backend 1



Relatório: Licenças

Funcionários em licença por tipo

3 dias

Dev Backend 2



Relatório: Estagiários

Estagiários ativos por setor

2 dias

Dev Backend 2



Relatório: PCD

Pessoas com deficiência (lei de cotas)

2 dias

Dev Backend 2



Sistema de cache

Redis para deixar o app mais rápido

3 dias

Dev Backend 1



Sistema de login

Autenticação e segurança

3 dias

Dev Backend 1



Documentação da API

Manual técnico com Swagger

2 dias

Dev Backend 2



MARCO 2 (25/Out): Sistema e Dados Funcionando



SEMANA 3-7: PROGRAMAR TELAS (01/Out - 02/Nov)



Configurar React

Preparar ambiente de programação das telas

2 dias

Dev Frontend 1



Implementar Design System

Aplicar cores e fontes definidas

3 dias

Dev Frontend 1



Criar componentes base

Botões, cards e elementos reutilizáveis

3 dias

Dev Frontend 2



Tela de login

Primeira tela que o usuário vê

3 dias

Dev Frontend 1



Dashboard principal

Tela com os 4 KPIs principais

4 dias

Dev Frontend 1



Sistema de filtros

Filtrar por campus, período, etc.

3 dias

Dev Frontend 2



Gráficos bonitos

Barras, pizza, linhas com Recharts

4 dias

Dev Frontend 2



Alertas visuais

Avisos quando algo está fora do normal

3 dias

Dev Frontend 1



Exportar para Excel

Baixar dados em planilha CSV

2 dias

Dev Frontend 2



App para celular (PWA)

Funcionar como app mesmo sendo site

3 dias

Dev Frontend 1



Otimizar para celular

Funcionar perfeito em telas pequenas

3 dias

Dev Frontend 2

SEMANA 8-9: JUNTAR TUDO E TESTAR (03/Nov - 17/Nov)



Conectar telas com dados

Fazer as telas mostrarem dados reais do MySQL

3 dias

Tech Lead + Devs



Testes automáticos

Verificar se cada parte funciona sozinha

2+2 dias

Dev Backend + Frontend



Testes completos (E2E)

Testar o app inteiro do início ao fim

4 dias

QA Tester



Testes finais com usuários

Gestores testando a versão quase pronta

2 dias

UX Researcher



Corrigir problemas encontrados

Resolver bugs e melhorar o que não funcionou

3 dias

Todos os Devs



MARCO 3 (17/Nov): App Completo e Testado



SEMANA 10-11: PUBLICAR E APRESENTAR (18/Nov - 27/Nov)



Publicar na internet

Colocar o app online para funcionar

2+1 dias

DevOps + Tech Lead



Testar versão online

Verificar se funciona na internet

1 dia

QA + UX



Escrever documentação

Manual técnico completo

2 dias

Tech Writer



Manual do usuário

Como usar o app passo a passo

2 dias

UX + Tech Writer



Gravar vídeo demonstrativo

Mostrar o app funcionando

2 dias

UX + Marketing



Preparar apresentação


Slides e roteiro para apresentar


3 dias

Todos



APRESENTAÇÃO FINAL (27/Nov): Projeto Concluído!

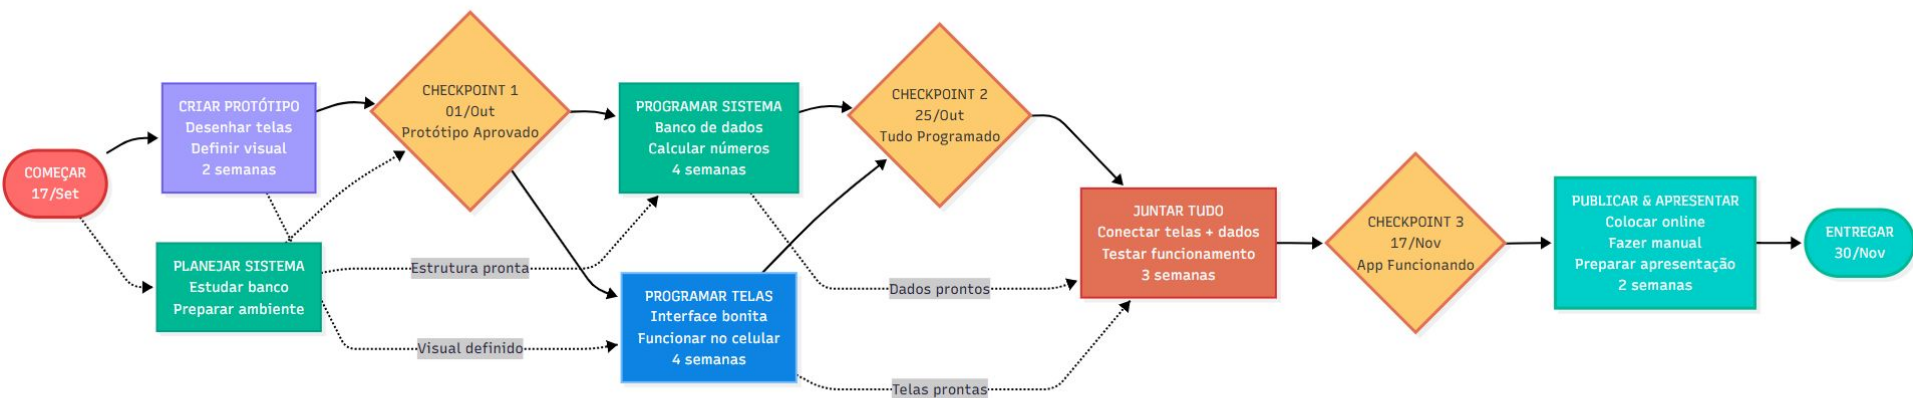

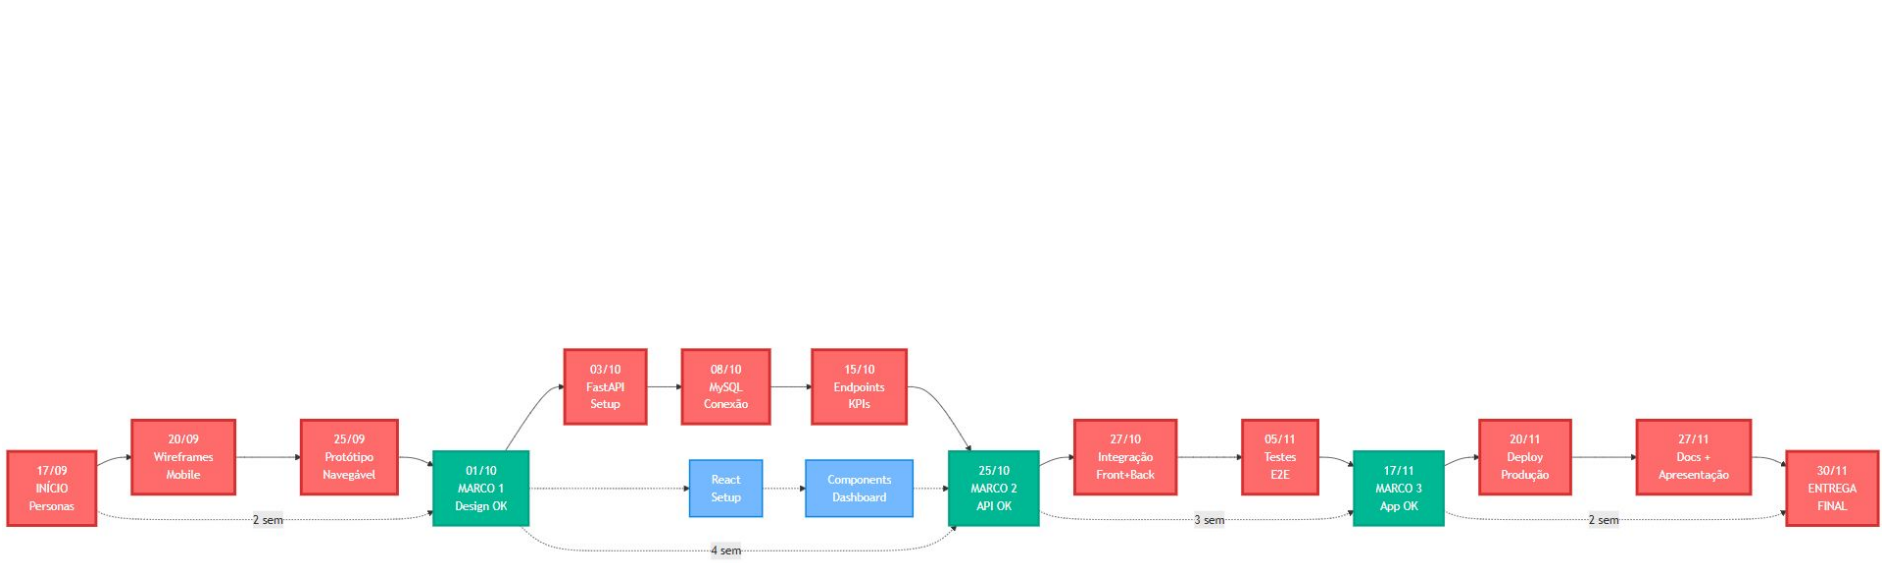



Calendário HEICOMP 2025

Dashboard Funcionários - 17/09/2025 a 27/11/2025
Equipe: 6 pessoas | Design-First | Apresentação: 27/11

70
Dias Úteis

10
Semanas

6
Membros

27/11
Apresentação



SETEMBRO 2025 - DESIGN SPRINT

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
1	2	3	4	5	6	7 Independência
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17 INÍCIO Personas	18 Personas Análise	19 Wireframes MySQL	20 Wireframes MySQL	21
22	23 Wireframes Arquitetura	24 Design System Arquitetura	25 Design System KPIs	26 Protótipo Setup	27 Protótipo Setup	28
29	30 Protótipo Backlog					



OUTUBRO 2025 - DESENVOLVIMENTO

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
29	30	1 ✓ MARCO 1 Protótipo OK	2 FastAPI React	3 MySQL Components	4 Modelos Components	5
6	7 Funcionários Login	8 Funcionários Login	9 Licenças Dashboard	10 Licenças Dashboard	11 Estagiários Dashboard	12 N.S. Aparecida
13	14 PCD Filtros	15 Cache Filtros	16 Cache Gráficos	17 Auth Gráficos	18 Auth Gráficos	19
20	21 Swagger Alertas	22 Swagger Alertas	23 Export CSV	24 PWA	25 ✓ MARCO 2 Sistema OK	26
27	28 PWA	29 Mobile	30 Mobile	31 Mobile		

🔗 NOVEMBRO 2025 - INTEGRAÇÃO E APRESENTAÇÃO

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
26	27	28	29	30	31	1 Integração
2 Finados	3 Integração	4 Integração	5 Testes	6 Testes	7 Testes E2E	8
9	10 Testes E2E	11 Testes E2E	12 Correções	13 Correções	14 Teste Mobile	15 Proclamação
16	17 MARCO 3 App Completo	18 Deploy	19 Deploy	20 Teste Produção	21 Documentação	22
23	24 Manual	25 Vídeo Demo	26 Ensaio Final	27 APRESENTAÇÃO FINAL!	28	29
30						
